

특 수 공 시

(단위:백만원)

사 업 명	소관 실국	사업 기간	총사업비	기투자	2010투자	종합 진도	공시 여부
1.. 어린이보호 안전환경 조성 CCTV 구축	정 책 관리실	2009 ~2014	21,200	1,000	6,600	37%	
2. 충주의료원 이전신축 BTL사업	보 건 복지국	2007 ~2012	56,412	1,314	12,600	22%	
3. 친환경농업 지구조성	"	2010	500		500	100%	
4. 농산물산지유통센터(APC) 건립	"	2010	4,078		4,078	100%	
5. 농어촌생활용수개발사업	문화여성 환 경 국	1998 ~2014	2,948,000	1,468,000	235,000	58%	
6. 혁신도시(중부신도시) 진입도로건설	균 형 건 설 국	2007 ~2012	69,745	30,710	11,328	60%	
7. 국비지원 지방도 확·포장사업	"	1996~	683,000	339,300	55,200	57%	
8. 지방도 확·포장사업	"	계속	538,600	351,500	38,500	65%	
9. 수해상습지개선사업	"	1999 ~2018	1,243,000	241,000	32,600	21%	
10. 도로명주소사업	"	1997 ~2011	19,307	18,208	638	99%	
11. 도시저소득주민 주거환경개선사업	"	2001 ~2012	72,334	63,406	2,000	88%	

1 어린이보호 안전환경 조성 CCTV 구축

□ 사업개요

- 사업목적 : 교통사고 예방과 각종 범죄로부터 어린이 안전보호
- 사업기간 : 2009 ~ 2014
- 사업량 : 964개소
- 사업내용 : 어린이 보호구역, 도시공원, 놀이터 등 CCTV 설치
- 총 사업비 : 212,200백만원 정도(국비 106,100 시군비 106,100)

□ 추진계획

총 사업계획			2010년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
964개소	2009~2014	21,200백만원	279개소	6,600백만원

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2010집행(c)	향후 집행		
21,200백만원	1,000백만원	6,600백만원	13,600백만원	35.8%	33.6%

- 사업추진현황

- 2010년도까지 12개 시군, 324개소 추진완료

□ 사업효과

- 초등학교, 유치원, 도시공원·놀이터 등 어린이보호 취약지역에 CCTV 안전환경 구축
- 24시간 모니터링과 지속적인 관리로 범죄예방 등 어린이 안전보호

□ 어린이 보호구역(청주남성초등학교) 구축완료 사진



2 충주의료원 이전신축 BTL 사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 지방의료원 현대화 추진
- 사업기간 : 2007 ~ 2012. 3.
- 사업량 : 연면적 31,669.59m²(지하3층, 지상4층), 300병상
- 사업내용 : 충주의료원 이전 신축
- 총 민간투자비 : 56,412백만원

□ 추진계획

총 사업계획			2011년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소	2007. 7 ~ 2012. 3	56,412백만원	1개소	30,615

□ 2010 추진실적

- 민자사업 집행현황

사업비집행현황				집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2010집행(c)	향후 집행		
56,412백만원	1,314백만원	12,600백만원	43,812백만원	22%	22%

- 사업추진현황
 - 충주의료원 이전신축 BTL사업 실시계획 승인
 - 충주의료원신축 공사 착공 '10. 05. 07

□ 사업효과

- 시설 장비 현대화를 통한 지역 보건서비스 향상
- 지역거점 공공병원의 경쟁력 강화 및 위상 제고

□ 조감도



3 친환경농업 지구조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 친환경영농에 필요한 시설, 장비지원으로 안정적 생산기반 구축
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12
- 사업량 : 2개지구(청원1, 단양1)
- 사업내용 : 친환경농자재생산시설, 친환경농산물 생산·유통 시설, 장비 지원
- 총 사업비 : 500백만원(국비 30%, 도비 25%, 시군비 25%, 자담 20%)

□ 추진계획

총 사업계획							2010년도 사업계획					
사업량	사업기간	사업비					사업량	사업비				
		계	국비	도비	시군비	자담		계	국비	도비	시군비	자담
2개지구	2010.1~12	500	150	125	125	100	2개소	500	150	125	125	100

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황												예산집행률 (b+c)/a×100	진도 종합
사업비(a)					기집행 b	2010집행(c)					향후 집행		
계	국비	도비	시군비	자담		계	국비	도비	시군비	자담			
500	150	125	125	100	-	500	150	125	125	100	-	100%	100%

- 사업추진현황

- 퇴비장, 저온저장고, 곡물건조기 등 총 16종 지원

※ '03년 ~ '09년 까지 : 52개소 / 13,757백만원 지원

□ 사업효과

- 지구단위 조성으로 안정적 영농기반 구축 및 농업경쟁력 확보
- 친환경농업 확산 유도를 위한 거점단지 마련

4 농산물산지유통센터(APC) 건립

□ 사업개요

- 사업목적 : 규모화·현대화된 산지유통시설 확충을 통한 농산물유통 거점 단지 육성으로 상품성 향상 및 물류비 절감
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.
- 사업량 : 2개소(4,745m²)
 - 농업회사법인 도담 : 청주시 흥덕구 신촌동 423-3 (2,186m²)
 - 백운농업협동조합 : 제천시 백운면 평동리 223 (2,559m²)
- 사업내용 : 집하선별장, 저온저장고, 전처리실, 세척시설, 선별시설, 상품당도및색택센서, 파레트, 지게차 등
- 총 사업비 : 4,078백만원(국비40%, 도비15%, 군비15%, 자담30%)

□ 추진계획

총 사업계획			2010년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
2개소 (4,745m ²)	2010	4,078백만원	2개소 (4,745m ²)	4,078백만원

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2010집행(c)	향후 집행		
4,078백만원	-	4,078백만원	-	100%	100%

- 사업추진현황
 - 농업회사법인 도담 : 100%(‘10. 8월 준공)
 - 백운농업협동조합 : 100%(‘10. 12월 준공)

□ 사업효과

- 농산물 생산단지 규모화에 의한 안정적인 시장 공급체계 구축
- 상품성 향상에 의한 부가가치 제고 및 물류비 절감

□ 위치도



농업회사법인 도담(청주시 흥덕구 신촌동 423-3)



백운농업협동조합(제천시 백운면 평동리 223)

5 농어촌생활용수 개발사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 마을상수도, 우물 등을 식수로 사용하는 농촌지역 주민들에게 수량이 풍부한 양질의 깨끗한 수돗물 공급
- 사업기간 : 1998. 1. ~ 2014. 12.
- 사업량 : 85개 면(기시행 76, 추진중 4, 향후 5)
- 사업내용 : 도내 면지역을 대상으로 지방상수도를 신설·확장
- 총사업비 : 2,948,000백만원(국비 80%, 도비 10%, 시군비 10%)

□ 추진계획

총 사업계획			2010년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
85개 면	1998. 1~2014. 12	2,948,000백만원	21개 면	235,000백만원

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황 (단위 :백만원)

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2010집행(c)	향후 집행		
2,948,000	1,468,000	235,000	1,245,000	58%	58%

- 사업추진현황
 - 10개 시·군 14지구 21개 면(신설 2, 확장 19)

□ 사업효과

- 깨끗하고 안전한 식수공급으로 농촌지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상

6 혁신도시(중부신도시) 진입도로건설

□ 사업개요

- 사업목적 : 진천·음성 혁신도시 조기 활성화 및 지역균형발전도모
- 사업기간 : '07 ~ '12
- 사업량 : 도로 L = 6.02km (4차로)
- 사업내용 : 진천·음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 확·포장공사
- 총사업비 : 69,745백만원 (국비 100%)

□ 추진계획

총 사업계획			2011년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소 (L = 6.02km)	2007 ~ 2012.	69,745백만원	1개소	28,925백만원

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황


예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2011집행(c)	향후 집행		
69,745백만원	30,710백만원	11,328백만원	27,707백만원	60.3%	60.3%

- 사업추진현황
 - 진입도로 기본 및 실시설계 완료
 - 진입도로 제영향평가 완료
 - 진입도로 편입용지 보상 추진
 - 진입도로 공사추진(2011. 7월말 추진공정율52%)

□ 사업효과

- 진천·음성 혁신도시(중부신도시) 조기건설 및 활성화 기대

□ 위치도

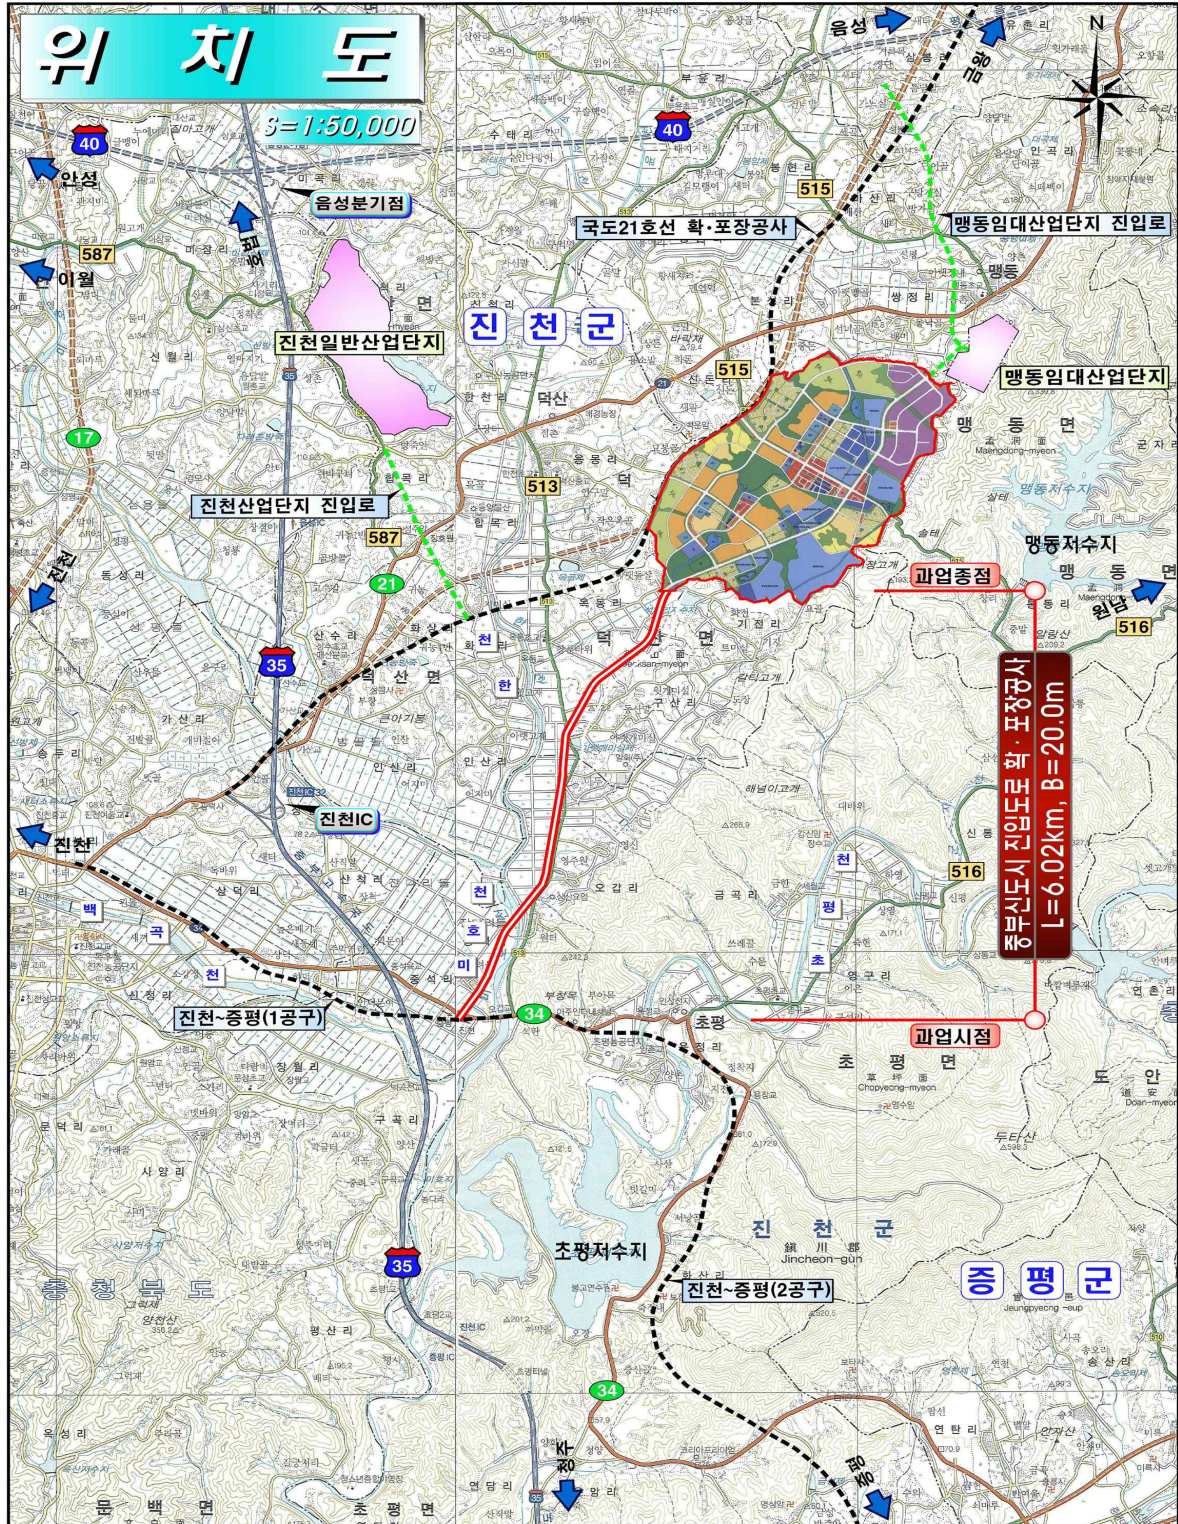

7 국비지원 지방도 확·포장사업

□ 사업개요

- 사업기간 : 1996~
- 위 치 : 충주, 제천, 청원, 괴산 일원
- 사업규모 : 11개소, L=51.2km(1996~2012)
(준공 3개소, 계속 7개소, 신규 1개소)
- 시행기관 : 충청북도
- 총사업비 : 6,830,000백만원

□ 추진계획

(단위 : km, 억원)

사업명		사업량	총사업비	기투자	2010년	향후	사업기간	공정(%)
계(10)		51.2	6,830	3,393	552	2,885		
소계		15.2	1,825	1,825				
준공	송면~사기막	4.0	526	526			'03~'08	100
	위림~명지	3.9	209	209			'04~'08	100
	청원IC~부용	7.3	1,090	1,090			'98~'09	100
계		36.0	5,005	1,568	552	2,885		37
계속사업	소계	31.0	4,545	1,558	522	2,465		61
	청풍대교	1.5	684	501	96	87	'03~'11	82
	가금~칠금	6.9	1,039	264	133	642	'03~'12	28
	남일~문의	6.8	749	404	72	273	'04~'11	52
	문의~대전	9.6	1,612	374	116	1,122	'06~'12	24
	신니~화석	2.2	156	5	36	115	'09~'12	14
	화석~문성	2.5	187	6	35	146	'09~'12	14
	문성~노은	1.5	118	4	34	80	'09~'12	14
신규	소계(3)	5.0	460	10	30	420		
	북충주IC~가금	5.0	460	10	30	420	'10~'13	

□ 추진상황

- 송면~사기막 : 준공('08. 12. 16)
- 위림 ~ 명지 : 준공('08. 5. 6)
- 청원IC~부용 : 준공('09. 4. 28)
- 청풍대교가설 : 2003년 보상 및 공사 중
- 가금 ~ 칠금 : 2003년 보상 및 공사 중, 충주시 시행
- 남일 ~ 문의 : 2004년 보상 및 공사 중
- 문의 ~ 대전 : 2006년 보상 및 공사 중
- 신니 ~ 노은 : 2009년 보상 및 신규 착공

□ 향후계획

- 시행중인 사업은 목표년도 내 준공을 위해 사업비 지원 지속 건의

□ 기대효과

- 주민숙원사업 해소 및 지역간 균형발전
- 이동성, 접근성 등 도로기능 제고로 원활한 교통소통 및 물류비용 절감

8 지방도 확·포장사업

□ 사업개요

- 기 간 : 1998~
- 위 치 : 도내 시군 일원(청주시 제외)
- 사업규모 : 46소, L=105.7km
- 시행기관 : 충청북도
- 총사업비 : 5,386,000백만원

□ 추진계획

(단위 : 억원)

사업구간		사업량	총사업비	기투자	2010년	향후	공정(%)
총계		46/105.7	5,386	3,515	385	1,486	65.3
'05준공지구		2/4.9	83	83			100
'06준공지구		4/13.1	756	756			100
'07준공지구		3/8.9	231	231			100
'08준공지구		10/18.6	440	440			100
'09준공지구		8/21.5	1,019	1,019			100
'10지구	소계	19/38.7	2,857	986	385	1,486	
	계속	14/28.1	1,778	866	294	618	51.7
	신규	4/10.2	859	0	36	823	설계지구
	오송역사	1/0.4	220	120	55	45	개발공사

□ 추진상황

(단위 : km, 억원)

총 사업계획				기투자	2010년	향후	공정(%)	
사업명	사업량	사업기간	총사업비					
총계(46)	105.3		5,386	3,515	385	1,486		
'05준공 2개소	4.9		83	83	-		100	
'06준공 4개소	13.1		756	756	-		100	
'07준공 3개소	8.9		231	231	-		100	
'08준공 10개소	18.6		440	440	-		100	
'09준공 8개소	21.5		1,019	1,019	-		100	
소계(18)	38.3		2,637	866	330	1,441	37.2	
계속	소계(14)	28.1		1,778	866	294	618	58.3
	방곡~울산	4.8	'04~'10	140	110	20	10	100
	성산~두릉	6.3	'02~'11	500	404	50	46	82
	부강철도기도교	0.5	'05~'10	110	96	10	4	100
	영하~우산	1.0	'07~'11	64	55	9	-	85
	송정~평촌	1.3	'07~'10	52	44	8	-	100
	문강~수회	2.2	'08~'11	48	28	10	10	50
	장암~지경	2.3	'08~'11	50	31	19	-	95
	석화~초정	1.3	'09~'11	67	25	18	24	50
	장야~매화	1.7	'08~'12	150	13	35	102	10
	속리산연계도로	1.0	'08~'13	140	11	30	99	15
	증평~용강	1.2	'08~'12	140	6	25	109	10
	용강~청안	2.4	'08~'12	150	6	25	119	10
	탑연~다락	1.6	'08~'14	150	20	35	95	10
	백자~남천	0.5	'09~'10	17	17	-	-	100
신규	소계(4)	10.2		859	-	36	823	
	산성~무성	2.5		286	-	15	271	설계지구
	금왕~내송	1.5		172	-	6	166	"
	양저~지수	4.7		188	-	10	178	"
	증평~도안	1.5		213	-	5	208	"
오송역진입도로	0.4	'09~'11	220	120	55	45	보상중	

□ 기대효과

- 주민숙원사업 해소 및 지역간 균형발전
- 원활한 교통소통 및 물류비용 절감, 도로기능 제고로 교통사고 예방

9 수해상습지 개선사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 하천개수를 통한 재해 예방으로 도민생명과 재산보호
- 사업기간 : 1999년 ~ 2018년
- 사업량 : L=820.2km
- 사업내용 : 축제 및 호안
- 총사업비 : 1,243,900백만원(국비 60%, 도비 40%)

□ 추진계획

총 사업계획			2010년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
820.2km	1999 ~ 2018	12,439억원	21.6km	369억원

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2010집행(c)	향후 집행		
12,439억원	2,410억원-	326억원	9,703억원	22%	25%

- 사업추진현황
 - '10년 20지구 21.6km 차수 준공

□ 사업효과

- 환경친화적 하천정비로 주민의 편익도모 및 삶의 질 향상

10 도로명주소사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 국민생활의 불편해소 및 물류비용절감 등 국가 경쟁력 향상
- 사업기간 : 1997. 2 ~ 2011. 12.
- 사업량 : 12개 시·군 (7,433km²)
- 사업내용 : 도로구간·도로명부여와 시설물설치·정비추진 및 고지·고시 등
- 총 사업비 : 19,307백만원(국비29%, 도비15%, 시군비 56%)

□ 추진계획

총 사업계획			2010년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
7,433km ²	1998~2011	19,307백만원	7,433km ²	638백만원

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2010집행(c)	향후 집행		
19,307백만원	18,208백만원	638백만원	461백만원	97.6%	99%

- 사업추진현황

- 도로명·건물번호판 시설물설치·정비 및 예비안내 실시
 - ※ 12개 시·군 시설물설치·정비 완료 및 예비안내 75만건 실시
- 사업 인지도 제고 및 법적주소 전환에 따른 지속적인 홍보추진

□ 사업효과

- 복잡한 지번주소를 도로명 주소로 전환하여 국민의 주소찾기 불편 해소
- 물류비용 절감 등 국가 경쟁력 강화
- 주민편익을 위한 위치정보 인프라 구축

□ 홍보추진자료



시민단체와 공동 가두 캠페인 전개



유아용 책자 발간



TV 홍보



달력 제작 홍보

11 도시저소득주민 주거환경개선사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시저소득 밀집지역의 열악한 주거환경개선
- 사업기간 : 2001년 ~ 2012년
- 사업량 : 18개지구
- 사업내용 : 도로, 공원, 공용주차장 등 도시기반시설 정비
- 총사업비 : 72,334백만원(국비50%, 도비10%, 시비 40%)

□ 추진계획

총 사업계획			2010년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
18개지구	2001년~2012년	72,334백만원	2개지구	2,000백만원

□ 2010 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2010집행(c)	향후 집행		
72,334백만원	63,406백만원	2,000백만원	6,928백만원	90%	88%

- 사업추진현황
 - 총 18개지구 중 16개지구 완공

□ 사업효과

- 도시 밀집지역의 열악한 주거환경개선으로 주민의 삶의 질 향상
- 도시기반시설 정비로 지역 균형발전 개발 유도
- 공공시설 정비로 지역 이미지 개선 및 도시 미관 향상
